



d.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź.19 p w ś c
9		*	Analiza i dobranie odpowiedniego hostingu	1 godz.	czw, 31.10.19	czw, 31.10.19	8RR	Pawel Krawczak	0%
10		*	Zadania projektowe	24 godz.	pią, 01.11.19	wto, 05.11.19	7		<b>T</b>
11	•	*	Projektowanie funkcjonalności	5 godz.	sob, 02.11.19	sob, 02.11.19		Anna Golabek;Pawel	
12	•	*	Projekotwanie bazy danych	3 godz.	nie, 03.11.19	nie, 03.11.19	11	Anna Golabek;Marcin	
13		*	Projektowanie wizualne strony	8 godz.	pon, 04.11.19	pon, 04.11.19	12	Pawel Krezelok	
14		*	Koniec projektowania	0 dn	wto, 05.11.19	wto, 05.11.19			
15		*	Tworzenie oprogramowania	16 dn	śro, 06.11.19	śro, 27.11.19	10		
16		*	Zadania front-endu	11 dn	śro, 06.11.19	śro, 20.11.19			
17		*	Graficzny szablon strony	5 godz.	śro, 06.11.19	śro, 06.11.19		Pawel Krezelok	

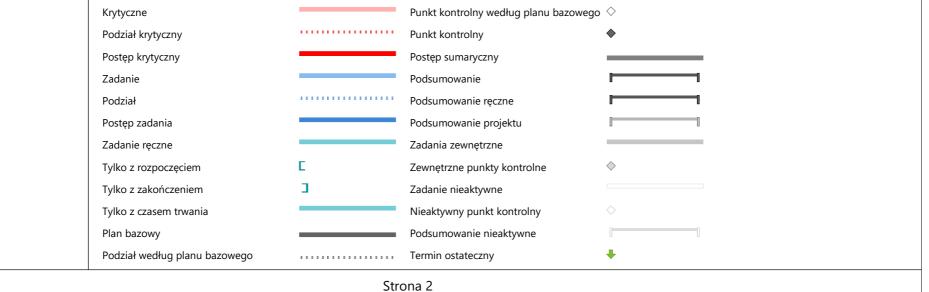

d.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź.19 p w ś c p
18		*	Implementacja strony w HTML oraz CSS	12 godz.	czw, 07.11.19	pią, 08.11.19	17	Igor Jakubowski;Pawel Krawczak;Adrian	
19	*	*	Implementacja strony w JS	5 godz.	sob, 09.11.19	sob, 09.11.19	18RR	lgor Jakubowski;Pawel	
20	•	*	Implementacja biblioteki programistycznej JQUERY	3 godz.	nie, 10.11.19	nie, 10.11.19	19	Pawel Krawczak;Igor Jakubowski;Adriar Łochowicz	
21		*	3/4 Front-endu	0 godz.	śro, 13.11.19	śro, 13.11.19			
22		*	Zadania back-endu	11 dn	czw, 14.11.19	czw, 28.11.19			
23		*	Implementacja kodu PHP	8 dn	czw, 14.11.19	pon, 25.11.19			
24		*	Połączenie z baza danych	32 godz.	czw, 14.11.19	wto, 19.11.19		lgor Jakubowski;Pawel	

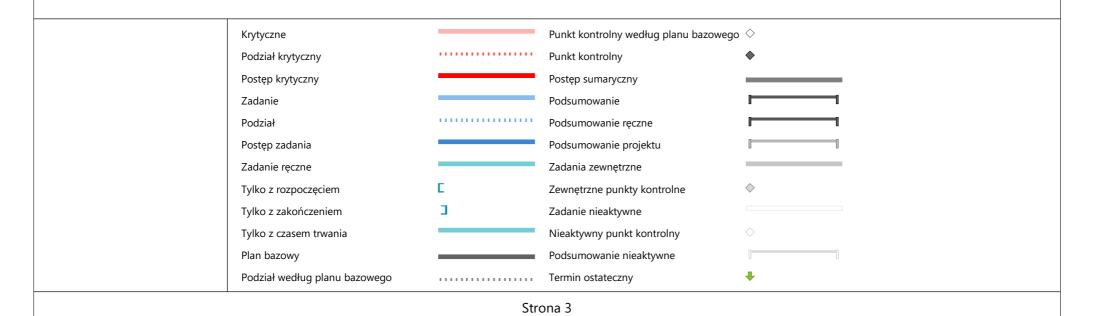

l.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź.19 p w ś c p
25		*	Napisanei funkcji dodawania i usuwania	16 godz.	śro, 20.11.19	czw, 21.11.19	24	Anna Golabek;Filip Szeszko;Pawel Krawczak;Marcin	
26		*	Koniec front-endu	0 godz.	śro, 20.11.19	śro, 20.11.19			
27		*	Napisanie funkcji sortowania	4 godz.	pią, 22.11.19	pią, 22.11.19	25	Filip Szeszko;Anna Golabek;Marcin	
28	•	*	Napisanie funkcji exportowania plików	3 godz.	sob, 23.11.19	sob, 23.11.19		Adrian Łochowicz;Igor Jakubowski	
29	*	*	Napisanie funkcji modyfikacji artybutów	5 godz.	nie, 24.11.19	nie, 24.11.19	28	Adrian Łochowicz;Igor Jakubowski	
			Krytyczne			Punkt kontrolny	według planu bazowe	ego ♦	
			Podział krytyczny			Punkt kontrolny		<b>♦</b>	
			Postęp krytyczny				ny		
			Zadanie			Podsumowanie			
			Podział			Podsumowanie r	ęczne		
			Postęp zadania			Podsumowanie p	projektu		
			Zadanie ręczne			Zadania zewnętr	zne		
			Tylko z rozpoczęc		iem <b>C</b>		kty kontrolne	$\Diamond$	
			Tylko z zakończenie			Zadanie nieaktyv	-		
			Tylko z czasem trw			Nieaktywny pun		$\Diamond$	
			Plan bazowy			<ul><li>Podsumowanie r</li></ul>			
			Podział według pla	nu bazowego			-	•	

					Harmor	nogram Gantaa.mpp			
d.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź.19 p w ś c p
30	*	*	Stworzenie generowanej tabeli wyników	12 godz.	pon, 25.11.19	wto, 26.11.19	29	Anna Golabek;Filip Szeszko;Pawel	
31	*	*	Napisanie funkcji Iogowania	5 godz.	wto, 26.11.19	wto, 26.11.19		Filip Szeszko;Adrian Łochowicz	
32	•	*	Napisanie funkcji rejestracji	5 godz.	wto, 26.11.19	wto, 26.11.19	31RR	Filip Szeszko	
33		*	Koniec projektu	0 godz.	śro, 27.11.19	śro, 27.11.19			

